Проект "Тронин"

Инфомация о проекте: сроки проекта: Sun Oct 01 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Dec 15 18:00:00 GMT+04:00 2017; стоимость проекта: 615000₽ (осталось - 527000₽) перерасход - 22900₽; число ресурсов - 6; всего задач - 30.

Список задач

- 1. "Система извлечения темпоральных знаний из текстов": плановая продолжительность 36.0d (Моп Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 35.0d, переработка -1d, переработка -1d, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.

 1.1. "Разработка ТЗ" (45%) : плановая продолжительность 11.0d (Моп Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 10.0d, переработка -1d, стоимость 161000₽, оставшаяся стоимость 93000₽, перерасход 4000₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.1.1. "Исследование предметной области" (100%): плановая продолжительность 1.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 Mon Oct 02 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 1.0d, переработка 0d, стоимость 12000₽, оставшаяся стоимость 0₽, перерасход 0₽, ресурсы Иванов.
- 1.1.2. "Планирование архитектуры проекта" (80%): плановая продолжительность 3.0d (Tue Oct 03 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 06 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 4.0d, переработка 1d, стоимость 64000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 28000₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.1.2.1. "Планирование модулей проекта" (100%): плановая продолжительность 1.0d (Tue Oct 03 09:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Oct 04 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 1d, стоимость 40000₽, оставшаяся стоимость 0₽, перерасход 20000₽, ресурсы Иванов, Петров.
- 1.1.2.2. "Планирование интерфейсов" (67%): плановая продолжительность 2.0d (Wed Oct 04 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 06 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка 1d, стоимость 24000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 8000₽, ресурсы Петров. 1.1.3. "Создание документа" (0%): плановая продолжительность 7.0d (Mon Oct 09 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017),

- продолжительность 5.0d, переработка -2d, стоимость 85000₽, оставшаяся стоимость 85000₽, перерасход -24000₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.1.3.1. "Создание UML диаграмм" (0%): плановая продолжительность 3.0d (Mon Oct 09 10:00:00 GMT+04:00 2017 Tue Oct 10 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка -1d, стоимость 49000₽, оставшаяся стоимость 49000₽, перерасход -12000₽, ресурсы Иванов, Лицензия на UML-редактор.
- 1.1.3.2. "Оформление документа" (0%) : плановая продолжительность 4.0d (Wed Oct 11 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка -1d, стоимость 36000₽, оставшаяся стоимость 36000₽, перерасход -12000₽, ресурсы Иванов.
- 1.2. "Кодирование" (0%) : плановая продолжительность 19.0d (Mon Oct 16 10:00:00 GMT+04:00 2017 Thu Nov 09 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 19.0d, переработка 0d, стоимость 264000₽, оставшаяся стоимость 264000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.2.1. "Создание модуля загрузки данных" (0%): плановая продолжительность 4.0d (Mon Oct 16 10:00:00 GMT+04:00 2017 Thu Oct 19 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 4.0d, переработка 0d, стоимость 48000₽, оставшаяся стоимость 48000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.2.1.1. "Загрузка из файлов" (0%) : плановая продолжительность 2.0d (Mon Oct 16 10:00:00 GMT+04:00 2017 Tue Oct 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 0d, стоимость 16000₽, оставшаяся стоимость 16000₽, перерасход 0₽, ресурсы Новиков.
- 1.2.1.2. "Загрузка данных с сайта" (0%) : плановая продолжительность 2.0d (Wed Oct 18 10:00:00 GMT+04:00 2017 Thu Oct 19 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 0d, стоимость 16000₽, оставшаяся стоимость 16000₽, перерасход 0₽, ресурсы Новиков.
- 1.2.1.3. "Тестирование" (0%) : плановая продолжительность 2.0d (Mon Oct 16 10:00:00 GMT+04:00 2017 Tue Oct 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 0d, стоимость 16000₽, оставшаяся стоимость 16000₽, перерасход 0₽, ресурсы Королев.
- 1.2.2. "Создание модуля анализа текста" (0%) : плановая продолжительность 10.0d (Mon Oct 16 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 27 18:00:00 GMT+04:00

- 2017), продолжительность 10.0d, переработка 0d, стоимость 112000₽, оставшаяся стоимость 112000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.2.2.1. "Анализ текста" (0%) : плановая продолжительность 6.0d (Mon Oct 16 10:00:00 GMT+04:00 2017 Mon Oct 23 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 6.0d, переработка 0d, стоимость 48000₽, оставшаяся стоимость 48000₽, перерасход 0₽, ресурсы Петров.
- 1.2.2.2. "Тестирование" (0%) : плановая продолжительность 4.0d (Tue Oct 24 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 27 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 4.0d, переработка 0d, стоимость 64000₽, оставшаяся стоимость 64000₽, перерасход 0₽, ресурсы Королев, Петров.
- 1.2.3. "Создание модуля вывода результатов" (0%): плановая продолжительность 3.0d (Mon Oct 30 10:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Nov 01 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка 0d, стоимость 40000₽, оставшаяся стоимость 40000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.2.3.1. "Вывод данных в табличном виде на форму" (0%): плановая продолжительность 1.0d (Mon Oct 30 10:00:00 GMT+04:00 2017 Mon Oct 30 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 1.0d, переработка 0d, стоимость 8000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 0₽, ресурсы Петров.
- 1.2.3.2. "Построение графиков" (0%): плановая продолжительность 2.0d (Tue Oct 31 10:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Nov 01 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 0d, стоимость 16000₽, оставшаяся стоимость 16000₽, перерасход 0₽, ресурсы Петров.
- 1.2.3.3. "Фильтрация данных" (0%) : плановая продолжительность 2.0d (Tue Oct 31 10:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Nov 01 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 0d, стоимость 16000₽, оставшаяся стоимость 16000₽, перерасход 0₽, ресурсы Новиков.
- 1.2.4. "Создание модуля сохранение данных" (0%): плановая продолжительность 6.0d (Thu Nov 02 10:00:00 GMT+04:00 2017 Thu Nov 09 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 6.0d, переработка 0d, стоимость 24000₽, оставшаяся стоимость 24000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.2.4.1. "CSV" (0%) : плановая продолжительность 1.0d (Thu Nov 09 10:00:00 GMT+04:00 2017 Thu Nov 09 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность -

- 1.0d, переработка 0d, стоимость 8000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 0₽, ресурсы Петров.
- 1.2.4.2. "XML" (0%) : плановая продолжительность 1.0d (Thu Nov 02 10:00:00 GMT+04:00 2017 Thu Nov 02 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 1.0d, переработка 0d, стоимость 8000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 0₽, ресурсы Новиков.
- 1.2.4.3. "JSON" (0%) : плановая продолжительность 1.0d (Fri Nov 03 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Nov 03 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 1.0d, переработка 0d, стоимость 8000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 0₽, ресурсы Новиков.
- 1.2.5. "Создание модуля отчетов" (0%): плановая продолжительность 5.0d (Thu Nov 02 10:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Nov 08 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 5.0d, переработка 0d, стоимость 40000₽, оставшаяся стоимость 40000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.2.5.1. "DOCX" (0%) : плановая продолжительность 3.0d (Thu Nov 02 10:00:00 GMT+04:00 2017 Mon Nov 06 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка 0d, стоимость 24000₽, оставшаяся стоимость 24000₽, перерасход 0₽, ресурсы Петров.
- 1.2.5.2. "PDF" (0%) : плановая продолжительность 2.0d (Tue Nov 07 10:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Nov 08 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 2.0d, переработка 0d, стоимость 16000₽, оставшаяся стоимость 16000₽, перерасход 0₽, ресурсы Петров.
- 1.3. "Создание документации" (0%) : плановая продолжительность 6.0d (Fri Nov 10 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 6.0d, переработка 0d, стоимость 168000₽, оставшаяся стоимость 168000₽, перерасход 0₽, ресурсы указаны в подзадачах либо отсутствуют.
- 1.3.1. "Интсрукция пользователю" (0%): плановая продолжительность 3.0d (Fri Nov 10 10:00:00 GMT+04:00 2017 Tue Nov 14 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка 0d, стоимость 84000₽, оставшаяся стоимость 84000₽, перерасход 0₽, ресурсы Иванов, Новиков, Петров. 1.3.2. "Инструкция программисту" (0%): плановая продолжительность 3.0d (Wed Nov 15 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка 0d, стоимость 84000₽, оставшаяся

стоимость - 84000₽, перерасход - 0₽, ресурсы - Иванов, Новиков, Петров.

- 2. "Тестовая задача": плановая продолжительность Этой задачи нет в базовом плане. (Mon Dec 11 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Dec 15 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 5.0d, переработка Этой задачи нет в базовом плане., переработка Этой задачи нет в базовом плане., ресурсы Максимов.
- 3. "Тестовая задача2": плановая продолжительность 0.0d (Mon Oct 02 10:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Dec 08 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 50.0d, переработка 50d, переработка 50d, ресурсы Максимов.

Список ресурсов

Максимов (60400): время работы - 637.0h, переработки - -197h

Иванов (168000): время работы - 120.0h, переработки - 104h


Петров (224000): время работы - 224.0h, переработки - 160h

Новиков (112000): время работы - 112.0h, переработки - 96h


Королев (48000): время работы - 48.0h, переработки - 32h

Лицензия на UML-редактор (25000): время работы - 1.0h, переработки - 15h


Графики

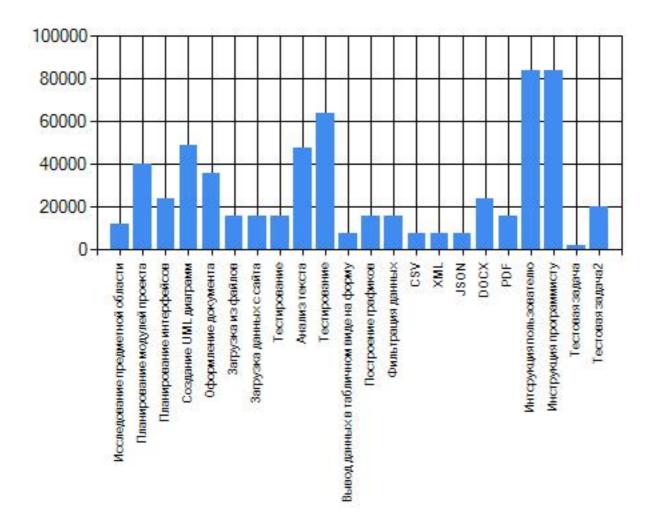


Стоимость задач

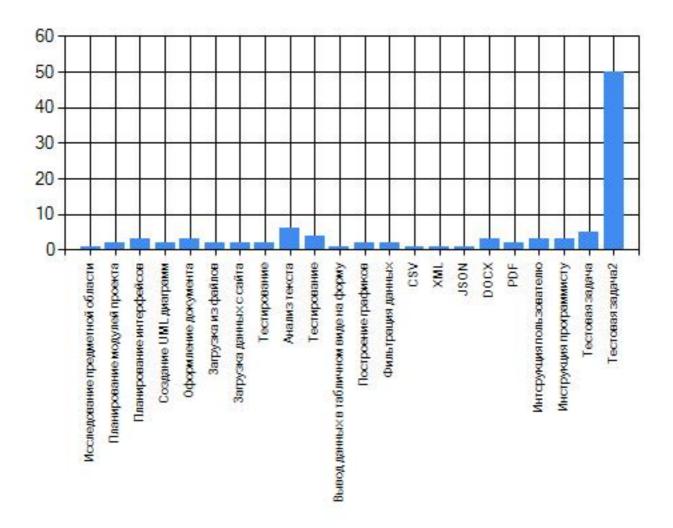


Продолжительность задач

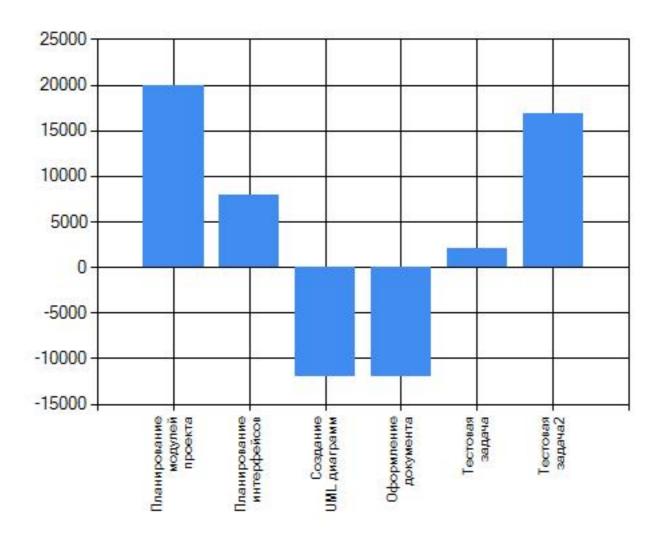


Перерасход средств на задачи

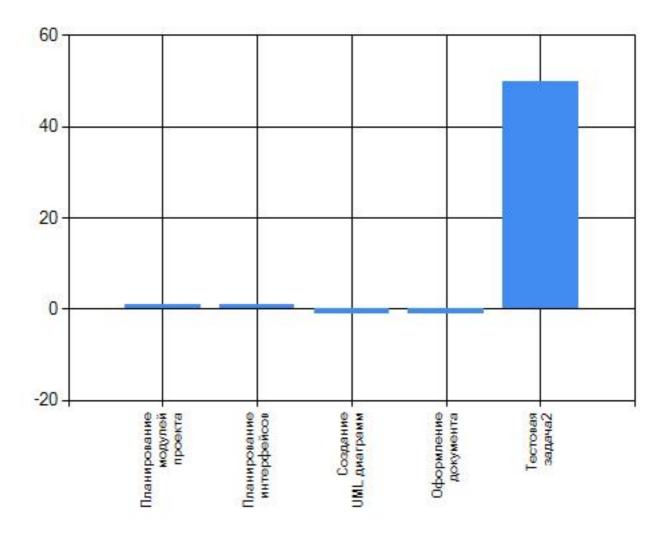


Отклонение по времени выполнения задач

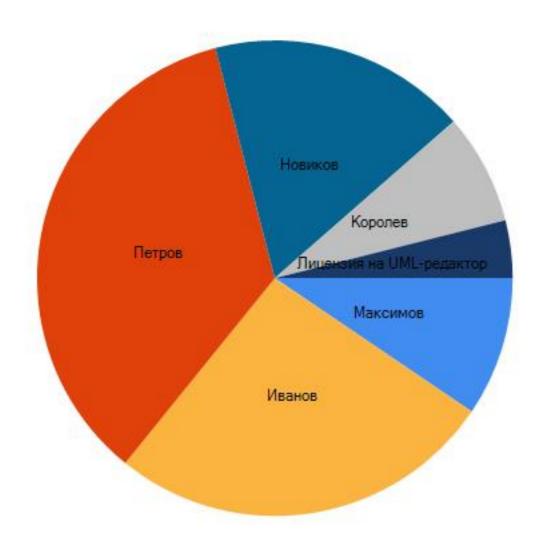

Затраты на ресурсы

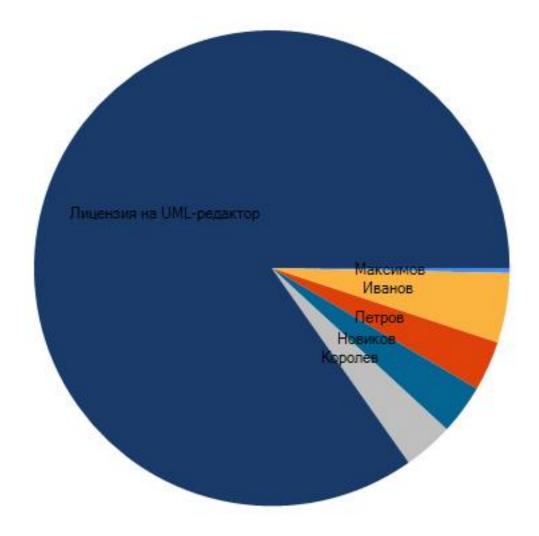

Затраты на ресурсы за одно использование / одну единицу времени

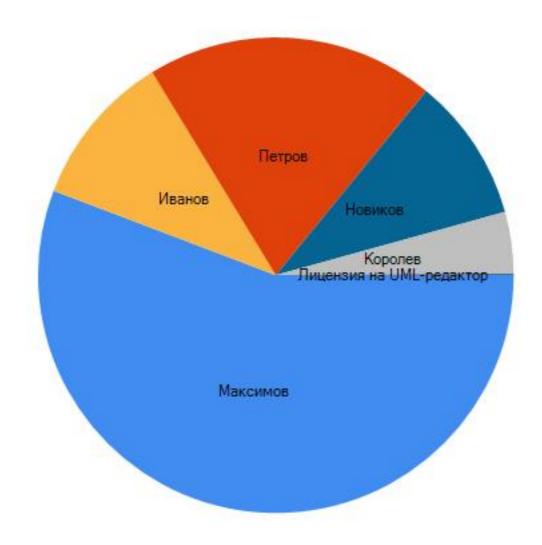

Время работы ресурсов
