## Проект "Тронин"

Инфомация о проекте: сроки проекта: Sun Oct 01 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Dec 15 18:00:00 GMT+04:00 2017; стоимость проекта: 615000₽ (осталось - 527000₽) перерасход - 22900₽; число ресурсов - 6; всего задач - 30.

## Оценки проекта

Перерасход времени: 400ч. Перерасход срдеств: 22900₽.

Средняя продолжительность задач: 35,64ч.

Суммарный перерасход времени ресурсов: -1091ч.

Оценка перерасхода средств: 3,72%, отличное качество планирования, перерасход минимален.

Оценка средней продолжительности задач: 222,73%, плохое качество планирования, задачи необходим разделить на подзадачи.

Оценка перерасхода времени: 108,7%, плохое качество планирования, перерасход вышел за пределы максимально допустимого.

#### Список задач с отклонениями

- 1. "Система извлечения темпоральных знаний из текстов": плановая продолжительность 288 (02.10.2017 5:00:00 17.11.2017 14:00:00), продолжительность 288, переработка -8, переработка -8, ресурсы не указаны.
- 1.1. "Разработка ТЗ" (45%) : плановая продолжительность 88 (02.10.2017 5:00:00 13.10.2017 14:00:00), продолжительность 88, переработка -8, стоимость 161000₽, оставшаяся стоимость 93000₽, перерасход 4000₽, ресурсы не указаны.
- 1.1.2. "Планирование архитектуры проекта" (80%): плановая продолжительность 24 (03.10.2017 5:00:00 06.10.2017 14:00:00), продолжительность 32, переработка 8, стоимость 64000₽, оставшаяся стоимость 8000₽, перерасход 28000₽, ресурсы не указаны.
- 1.1.2.1. "Планирование модулей проекта" (100%) : плановая продолжительность 8 (03.10.2017 5:00:00 04.10.2017 14:00:00), продолжительность 16, переработка 8, стоимость 40000₽, оставшаяся стоимость 0₽, перерасход 20000₽, ресурсы Иванов, Петров.
- 1.1.2.2. "Планирование интерфейсов" (67%) : плановая продолжительность 16 (04.10.2017 5:00:00 06.10.2017 14:00:00), продолжительность 24, переработка 8, стоимость 24000₽, оставшаяся стоимость 8000₽,

перерасход - 8000₽, ресурсы - Петров.


перерасход - -12000₽, ресурсы - Иванов.

- 1.1.3. "Создание документа" (0%) : плановая продолжительность 56 (09.10.2017 6:00:00 13.10.2017 14:00:00), продолжительность 56, переработка -16, стоимость 85000₽, оставшаяся стоимость 85000₽, перерасход -24000₽, ресурсы не указаны.
- 1.1.3.1. "Создание UML диаграмм" (0%): плановая продолжительность 24 (09.10.2017 6:00:00 10.10.2017 14:00:00), продолжительность 24, переработка -8, стоимость 49000₽, оставшаяся стоимость 49000₽, перерасход -12000₽, ресурсы Иванов, Лицензия на UML-редактор. 1.1.3.2. "Оформление документа" (0%): плановая продолжительность 32 (11.10.2017 6:00:00 13.10.2017 14:00:00), продолжительность 32, переработка -8, стоимость 36000₽, оставшаяся стоимость 36000₽,
- 3. "Тестовая задача2": плановая продолжительность 0 (02.10.2017 6:00:00 08.12.2017 14:00:00), продолжительность 400, переработка 400, переработка 400, ресурсы Максимов.


## Список ресурсов с отклонениями

Максимов (60400): время работы - 637, переработки - -587 Иванов (168000): время работы - 120, переработки - -121 Петров (224000): время работы - 224, переработки - -222 Новиков (112000): время работы - 112, переработки - -112 Королев (48000): время работы - 48, переработки - -48 Лицензия на UML-редактор (25000): время работы - 1, переработки - -1


# Графики

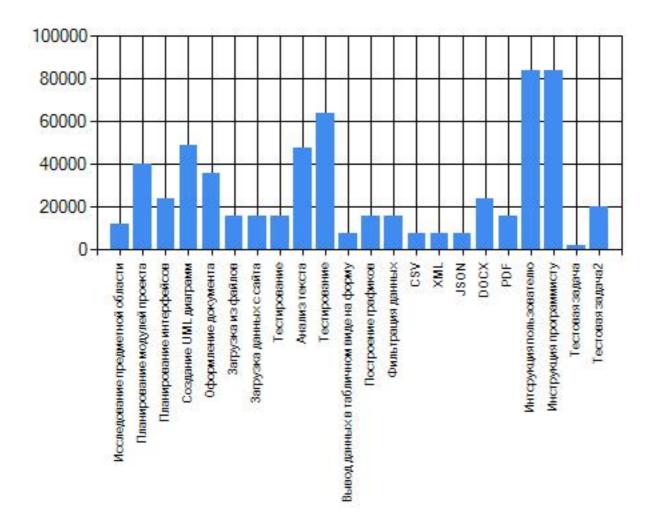


Стоимость задач

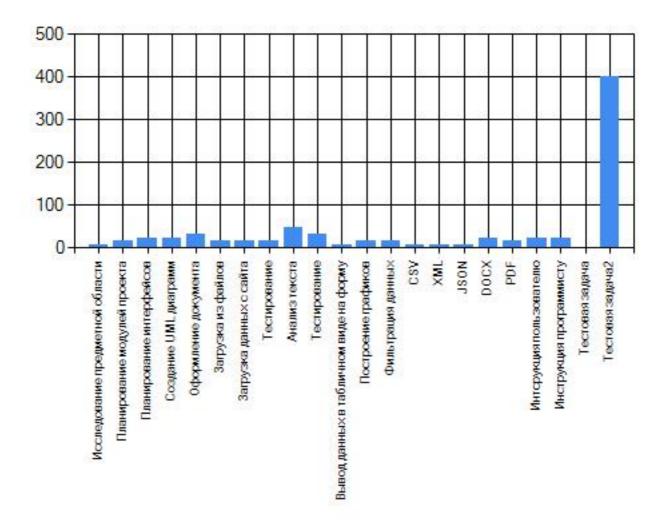


Продолжительность задач

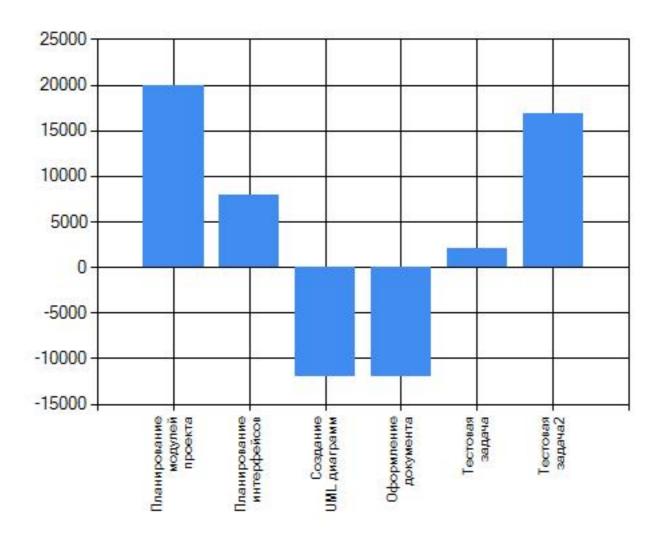


Перерасход средств на задачи

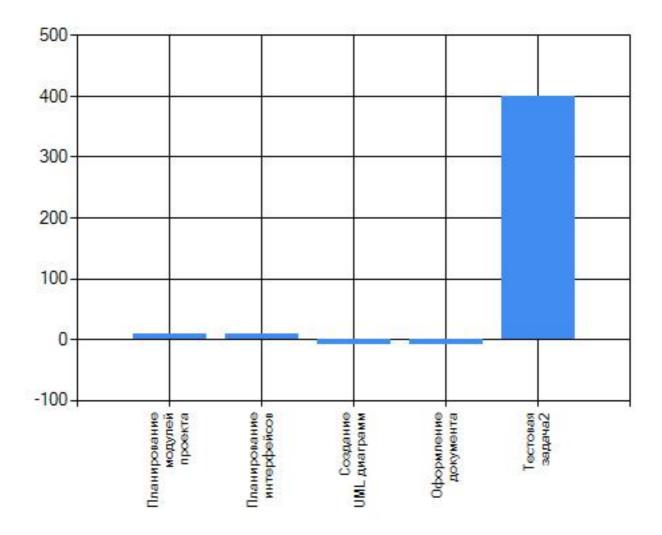


Отклонение по времени выполнения задач

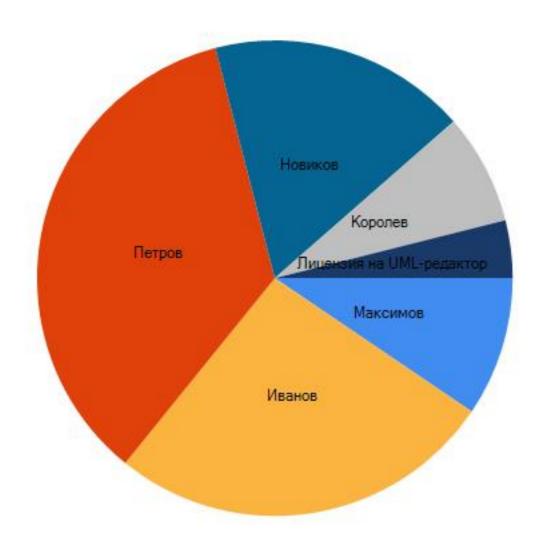

Затраты на ресурсы

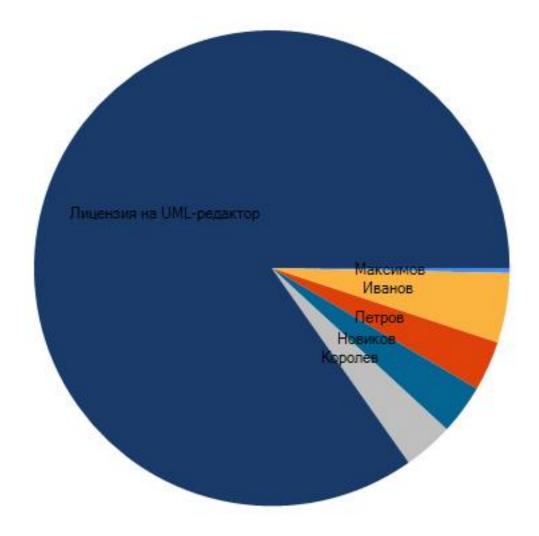

Затраты на ресурсы за одно использование / одну единицу времени

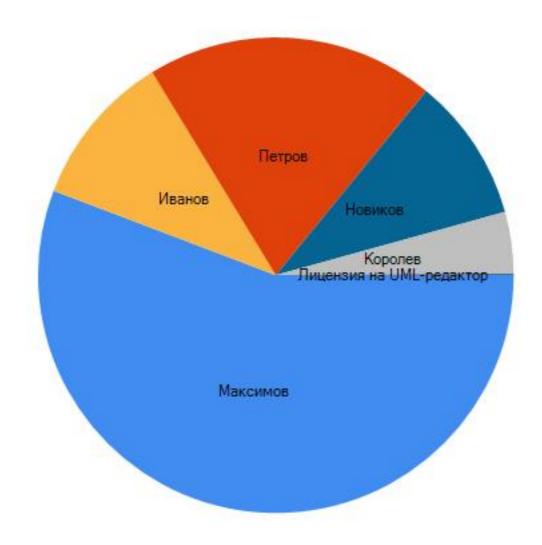

Время работы ресурсов
